



FIDEPROES
FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

ENTREGA-RECEPCION PARCIAL

CONTRATO NO. FIDEPROES-CPSA-011/2022
Monterrey, N. L. 03 de marzo de 2023

Por medio del presente se hace constar que la prestadora de servicios **GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, SA DE CV**, previo visto bueno de la **C. Rosa Nelly Treviño**, Directora del Plantel Educativo **Escuela Secundaria No. 1 General Sostenes Rocha**, ubicado **Calle Benito Juarez, Colonia Centro, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León**; realizó lo siguiente:

- 100 ML. DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 12.5 CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS DE ALTO. INCLUYE TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). (CANCHA 1)
- 96.80 ML. DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 12.5 CON UNA ALTURA DE 2.00 MTS DE ALTO. INCLUYE TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). (CANCHA 2)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON FABRICADO CON MALLA CICLÓNICA Y POSTES GALVANIZADOS (CANCHA 1)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON FABRICADO CON MALLA CICLÓNICA Y POSTES GALVANIZADOS (CANCHA 2)

Dichos trabajos fueron dentro de las instalaciones del referido plantel, mismos que se constata se encuentran perfectamente terminado. Para constancia se anexa al presente cuadro fotográfico a color.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la párrafo segundo clausula cuarta del contrato número FIDEPROES-CPSA-011/2022 de fecha 12 de diciembre de 2022.

Visto bueno.



C. JORGE PÉREZ HILERIO
Jefe de Adquisiciones de
FIDEPROES

Visto bueno




C. TERESITA CLAVERO SALAS
Proyectista
FIDEPROES

Prestador de Servicio



C. CESAR ALEJANDRO GODINA VILLANUEVA
Administrador Unico de la empresa
Grupo Constructiva Mexicana, SA DE CV

Escuela





C. ROSA NELLY TREVIÑO
Directora de la Escuela Secundaria No. 1
General Sostenes Rocha



**Instalación de malla ciclónica en Esc. Sec. No. 1 Gral. Sostenes Rocha
(Salinas Victoria N.L.)**


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ANTES

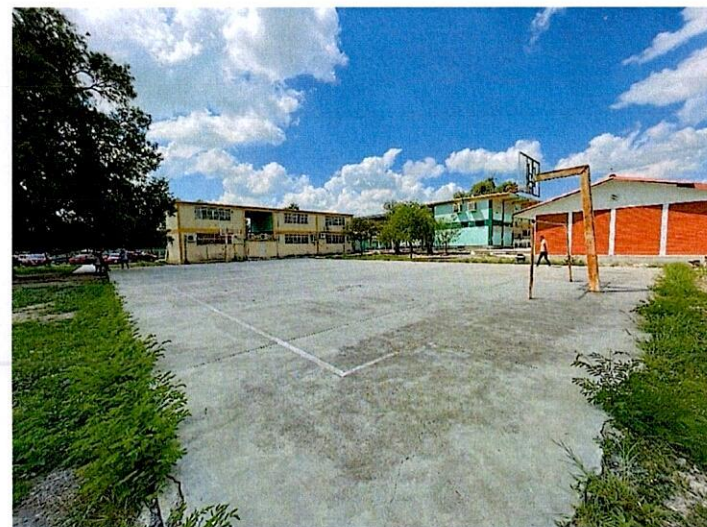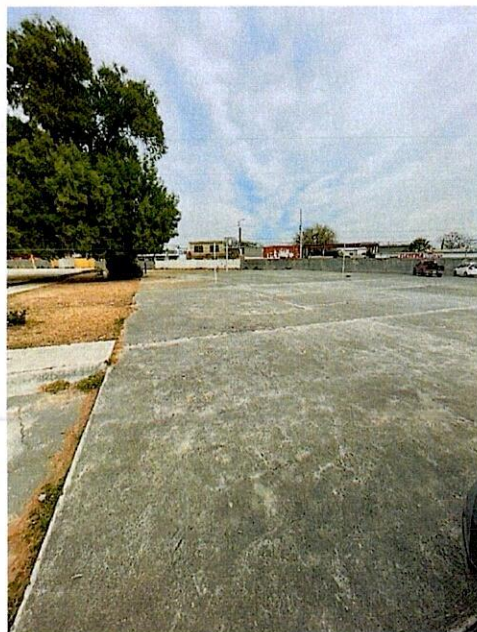


INICIO DE PERFORACIONES PARA EL MONTAJE DE POSTES GALVANIZADOS




* LA PROFUNDIDAD DE CADA POZO FUE DE 50 cm *



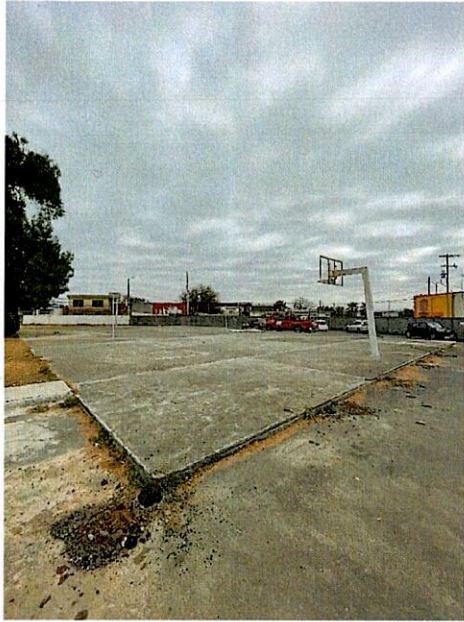






MONTAJE DE POSTES GALVANIZADOS

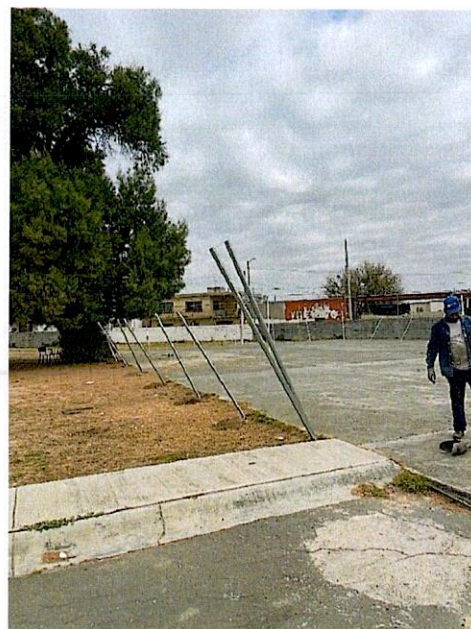




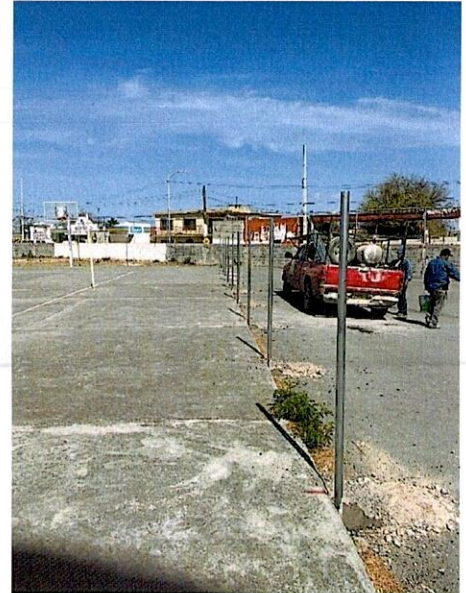


MONTAJE DE MALLA CICLONICA

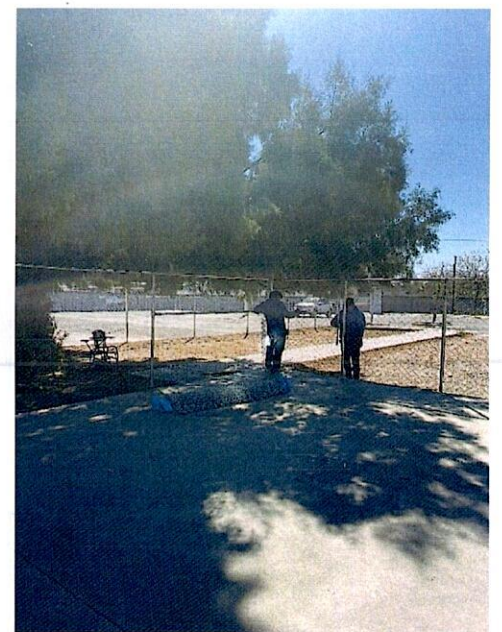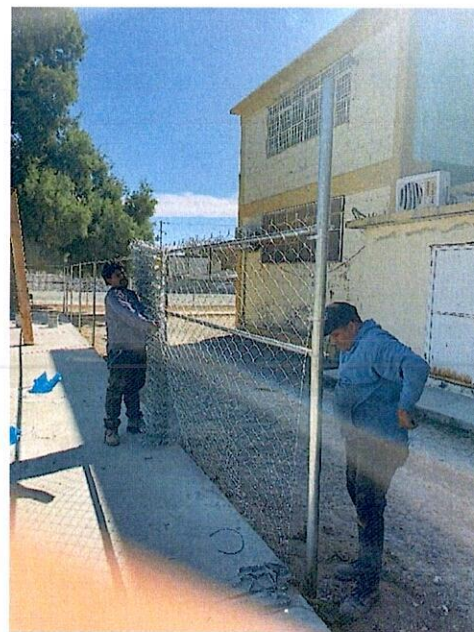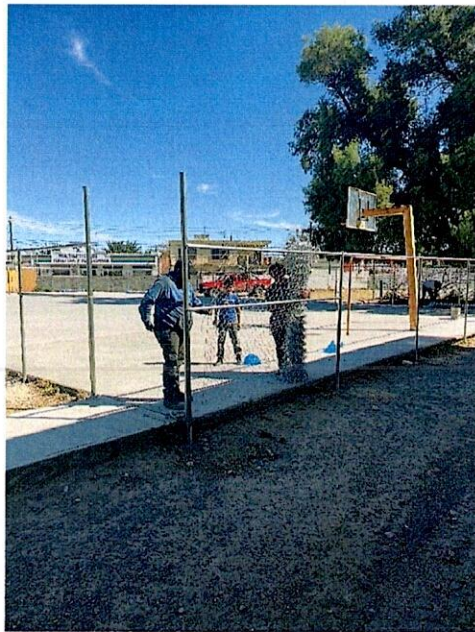

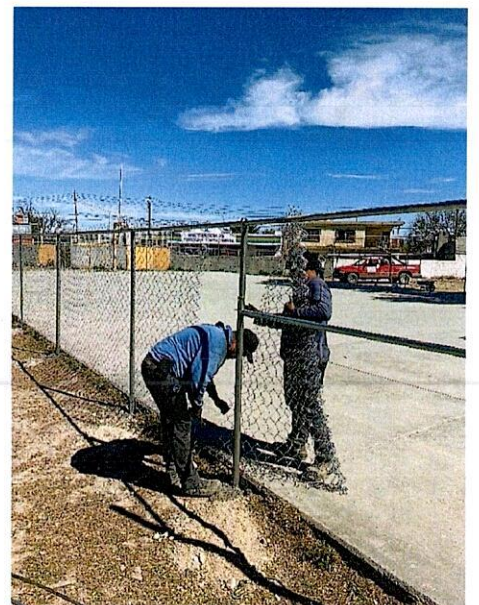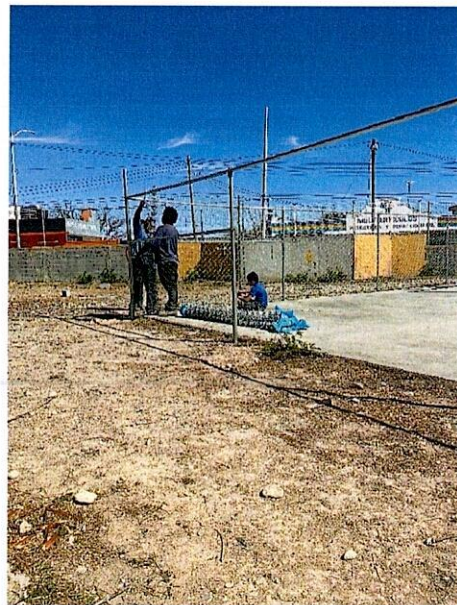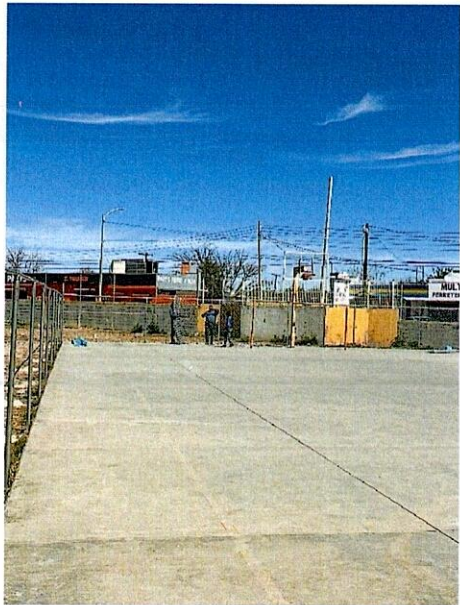
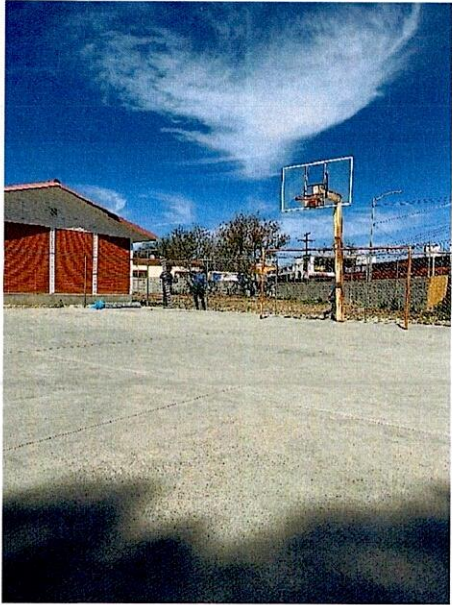





INSTALACIÓN DE PUERTAS FABRICADAS EN MALLA CICLONICA Y MARCOS EN TUBOS GALVANIZADOS

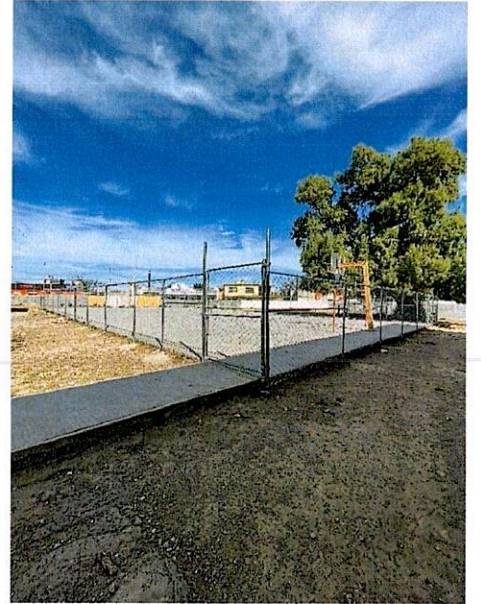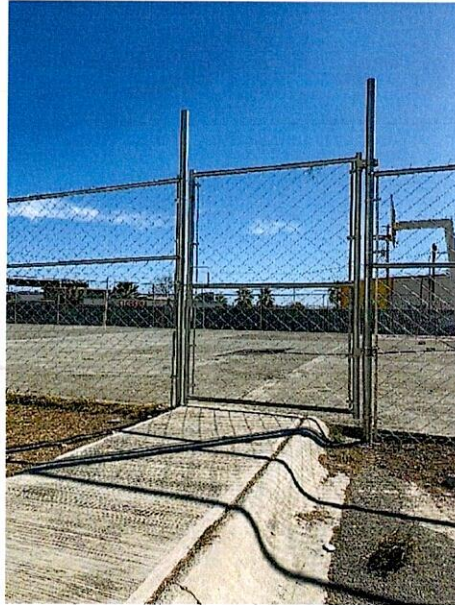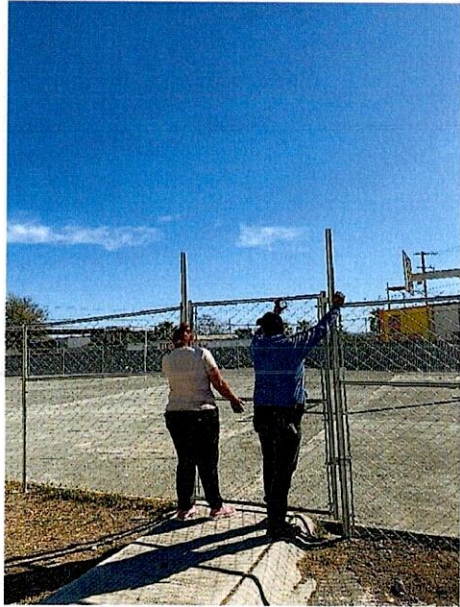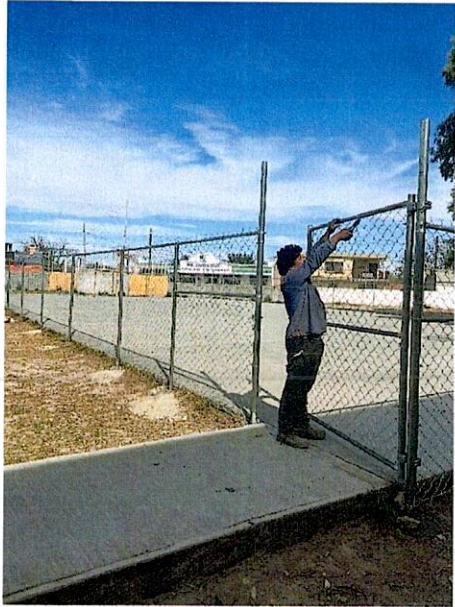



CONCLUSIÓN DE PROYECTO (DESPUÉS).

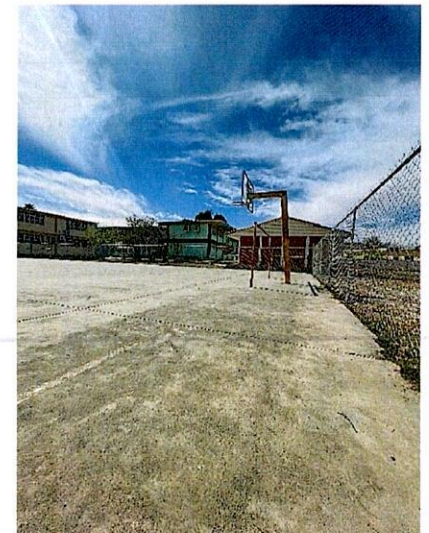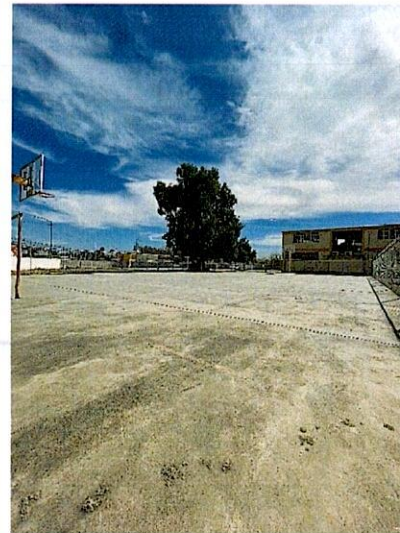

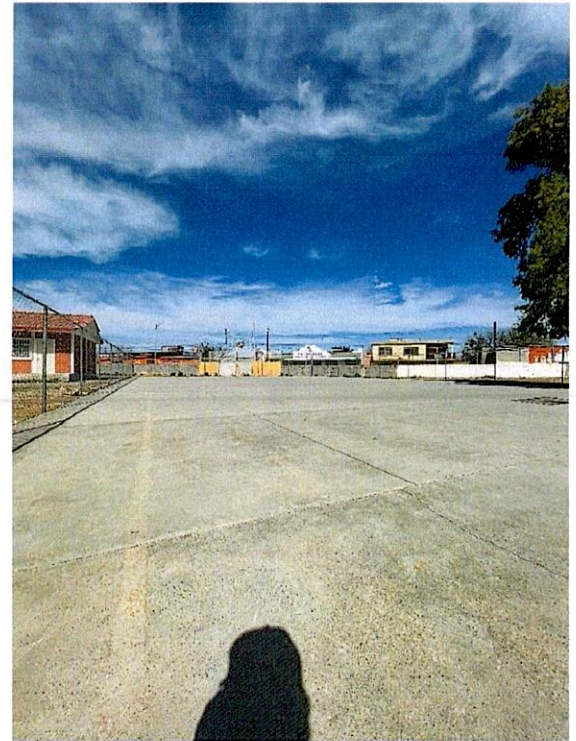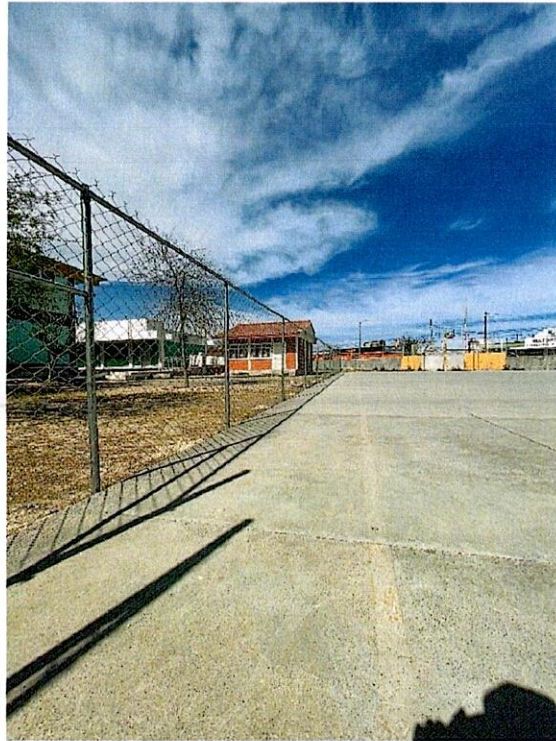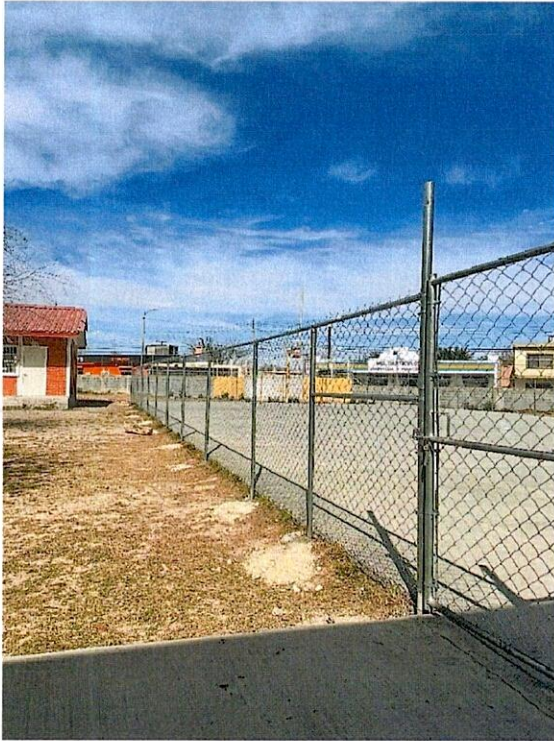

SERVICIOS EXTRAS

- 31ml para poder cerrar segunda cancha
 - Puerta extra en segunda cancha
 - Refuerzo con alambre liso por la parte de abajo para que no salgan los balones.
-
